

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				煙突				100m▼ 180m▼ 据付完了▼											


※開放エリア：2025年度中に利用開始予定



北下浦ふるさとマラソン応援
発電所前で実施された北下浦ふるさとマラソンの給水所のお手伝いと応援を行いました。また走者としても参加しており、大会を大いに楽しみました。



2号ボイラ設備 消防検査
2号機の本格的な試運転開始前に、ボイラ消火設備などが万全であることを横須賀市消防局に確認いただきました。

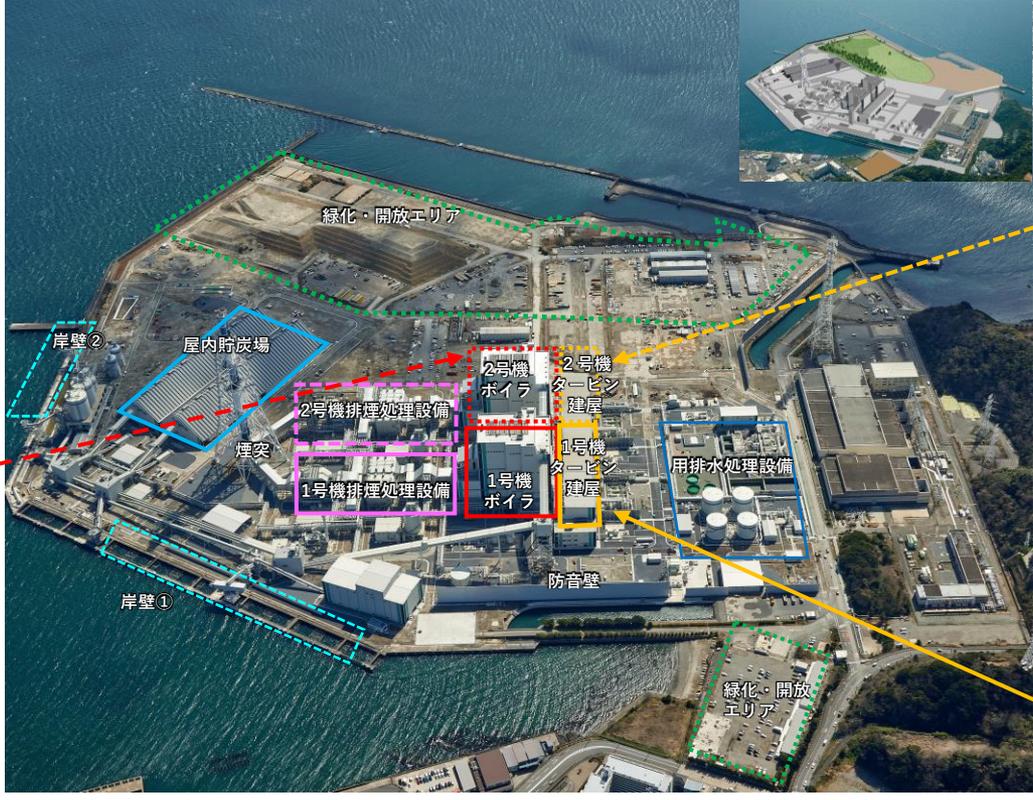

2号タービン発電機 工事完了
2号タービン発電機の工事が完了しました。多くの関係者が関わり、安全第一でここまで辿り着きました。号機間違え防止のために2号は赤帯の塗装がされています。(1号は下の写真のように青帯塗装です)



1号発電設備 性能試験
発電設備の性能試験を行い、計画よりも高い性能であり、より少ない燃料で発電できることを確認しました。

工事概要

- ボイラ** 2号空気予熱器（ボイラで燃焼するための空気を温める設備）の運転に先立ち、洗浄機能の確認を行いました。
- タービン** 2号タービン発電機を低速で回転させて設備に異常がないことを確認しました。
- 電気設備** 2号構内の照明や放送設備の設置が完了しました。
- 共通設備** 石炭を供給するためのコンベアを2号ボイラへも送れるように延長しました。

先月までの実績工事進捗率

- 1号機工事進捗率 99.2%
- 2号機工事進捗率 93.2%
- 総合工事進捗率 96.9%
